N°	Nom de la tâche	Durée
1	Rédaction CDC + consultation	7 mois
2	Commande phase 0,5 pour réservation créneau	0 jour
3	Démontage dégraisseuse phase vapeur (Phase 0,5)	2 sm
4	Commande phase 1	0 jour
5	Approvisionnement phase 1	6 mois
6	Intervention phase 1	1 mois
7	Qualifications clients phase 1	4 mois
8	Commande phase 2	0 jour
9	Approvisionnement phase 2	6 mois
10	Intervention phase 2	1 mois
11	Qualifications clients phase 2	4 mois

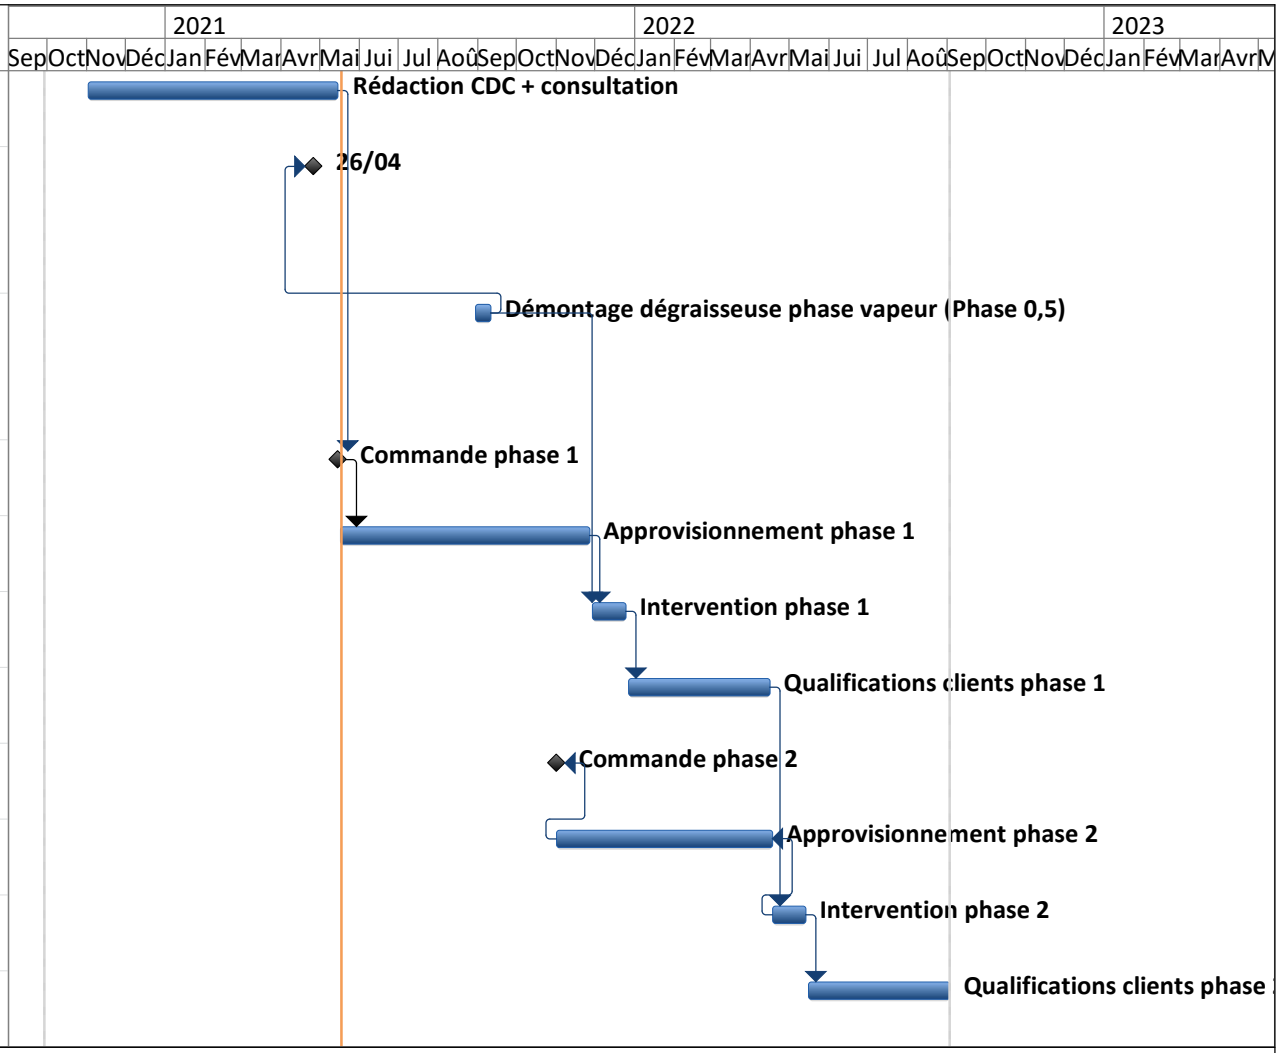

Projet : Master schedule T3S2021
Date : Mar 18/05/21

Tâche		Jalons externes		Report récapitulatif manuel	
Fractionnement		Tâche inactive		Récapitulatif manuel	
Jalon		Jalon inactif		Début uniquement	
Récapitulative		Récapitulatif inactif		Fin uniquement	
Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Échéance	
Tâches externes		Durée uniquement		Avancement	
